KUNTA 2025	Talousarvio 15 735 000	Muutettu talousarvi pvm	KULUVA VUOSI Työohjelma	Toteuma	Toteuma %
Ei alkuperäisessä rakentamisohjelmassa	€€€		15 615 000	12 614 629,93	81 %
ETELÄ TUUSULA TIET JA LIIKENNE VÄYLÄT	**9 670 000**		**9 670 000**	**6 993 288**	
Autoasemankatu	300 000		350 000	1 291 600,83	369,03 %
Mattila2 Keski- ja pohjoisosa	1 000 000		200 000	12 000,00	6,00 %
Häriskivi	0		125 000	50 392,81	40,31 %
Linja-autoterminaali (matkakeskus)	100 000		120 000	281 956,95	234,96 %
Varuskunnanaukio	300 000		300 000		
Tykkimiehenraitti	600 000		600 000	487 835,53	81,31 %
Ristikiven jkpp	300 000		300 000	135 624,94	45,21 %
Pakkasraitin jkpp	100 000		200 000	12 300,00	6,15 %
Suutarintie	50 000		50 000		
Kivikiila, Koskenmäentie	200 000		230 000		
Pellavamäki	0			378,22	
Lahelanpelto2	150 000		175 000	371 812,89	212,46 %
Lahelanpelto3	200 000		200 000		
Mattila2 Etelä	800 000		1 000 000	331 060,25	33,11 %
Urkka-aukio + LPA	1 000 000		1 000 000	1 272 216,65	127,22 %
Focus/Sammonmäki	600 000		600 000		
Kehä4	180 000		180 000		
Sula 3 (Laajennusalueet Sula)	2 200 000		2 200 000	1 680 217,18	76,37 %
Rykmentinportti & tp-alue Itäinen ja läntinen	400 000		610 000	87 845,41	14,40 %
Riihikallion koulun parkki / koulun budjetissa	0			203 936,96	
Metsontie	0		250 000		
Ryk.puist. Kamp ja urheilupuiston välinen raitti ja latusilta	260 000		260 000	554 405,73	213,23 %
Ristikiven LP-alue	0		25 000	62 768,90	251,08 %
Tuomalan metsän kuntorata ja p-alue	50 000		25 000		
Urkan yleisurheilukentän korjaus	50 000		50 000		
Varuskunnantie				14 288,59	
Kievarintie jkpp	30 000		30 000		
Lahlean kampus	500 000		500 000	142 646,27	28,53 %
palkkitien TP-alue	90 000		90 000		
KELLOKOSKI TIET JA LIIKENNEVÄYLÄT	**1 350 000**		**1 350 000**	**1 820 040**	
Joenranta	1 300 000		1 250 000	1 727 443,12	138,20 %
Seppäinpuisto	0		40 000	53 970,00	134,93 %
Omenalahdentie				38 627,25	
Kaatopaikka	0		10 000		
Kellokosken yleisurheilukentän korjaus	50 000		50 000		
JOKELA TIET JA LIIKENNEVÄYLÄT	**1 180 000**		**1 180 000**	**1 596 981**	
Blennerintie	200 000		200 000	115 435,34	57,72 %
Vaunutehtaan alue	400 000				
Vallun tp-alue	230 000		30 000		
Opintie jk/pp	300 000		900 000	1 475 954,33	163,99 %
Härkäkaivon alue				5 591,54	
Jokelan Yleiurheilukentän korjaus	50 000		50 000		
MUUT KOHTEET TIET JA LIIKENNEVÄYLÄT	**870 000**		**870 000**	**451 232**	
Liikennevalojen saneeraus	20 000		20 000		
Katuvalojen saneeraus	250 000		280 000	254 036,32	90,73 %
Katuvalokeskusten uusinta	30 000		30 000	44 318,00	147,73 %
Valaistuksen ohjausjärjestelmän uusinta	0		0		
viitoitus ja opastus	10 000		10 000		
Liikenneturvallisuuden parantaminen, pienet kohteet	0		0	35 233,15	
Linja-autopysäkit	90 000		90 000	16 990,00	18,88 %
Siltojen saneeraus	300 000		300 000	74 849,79	24,95 %
Puupylväiden uusinta	30 000		0		
Liikennemerkkien uusiminen	50 000		50 000	25 804,98	51,61 %
Ajopuomit kevytväylille	20 000		20 000		
Vesistöt	70 000		70 000		
Muut pitkävaikutteiset menot	**780 000**		**780 000**	**334 474**	
Sammonmäki IV, voimajohtolinjat	70 000		70 000		
Rykmentinpuiston tp-alueen liittymä	200 000		200 000	46 970,00	23 %
Kehä IV, voimajohtolinjat	80 000		80 000		
Pääradan alikulku Peltokaaressa	240 000		240 000	255 808,51	107 %
Jokelantien alikulku Peltokaaressa	90 000		90 000	31 695,63	35 %
Mt 11671 jk/pp (linjatie)	100 000		100 000		
MUUT	**20 000**		**0**		
	20 000				
PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT	**1 695 000**		**1 695 000**	**1 377 283**	
Häriskivi	0		50 000	13 143,76	26,29 %
Pellavamäki	0		15 000	160 000,00	
Patteriston puisto	200 000		200 000	123 650,49	61,83 %
Pitkospuut Koskenmäentie-Kalamestarintie	300 000		300 000	245 596,55	81,87 %
Valkamapuiston valaistus	200 000		250 000	99 659,93	39,86 %
Jokipuisto ja Myllypuisto	70 000		70 000	55 809,00	79,73 %
Urheilukeskuksen leikkipuisto	250 000		0		
vanutehdas	200 000		115 000	178 771,89	155,45 %
Agustanpuisto	0		0	192 308,31	
Etelä-Tuusulan muut puistot	70 000		70 000	30 819,07	44,03 %
Lankalenkki	0		0	4 000,00	
Koululammenpuisto	50 000		50 000	6 280,00	
Apteekinlampi	0		20 000	9 743,52	48,72 %
Jokela pienet saneerauskohteet	20 000		20 000		
Joenranta	300 000		500 000	257 500,00	51,50 %
Kellokoski pienet saneerauskohteet	15 000		15 000		
Kausivalaistus	20 000		20 000		
VESISTÖT	**70 000**		**70 000**	**41 331,34**	
Keravanjoki	20 000		15 000		
Palojoki	20 000		25 000		
Tuusulanjärvi	0		0		
Rusutjärvi	30 000		30 000	3 955,00	13,18 %
Tuusulanjärven ympäristö	0			37 376,34	
Rakennusten pihainvestoinnit	**100 000**				
Erillinen työohjelma					

Työ-ohjelman värikoodit selityksineen
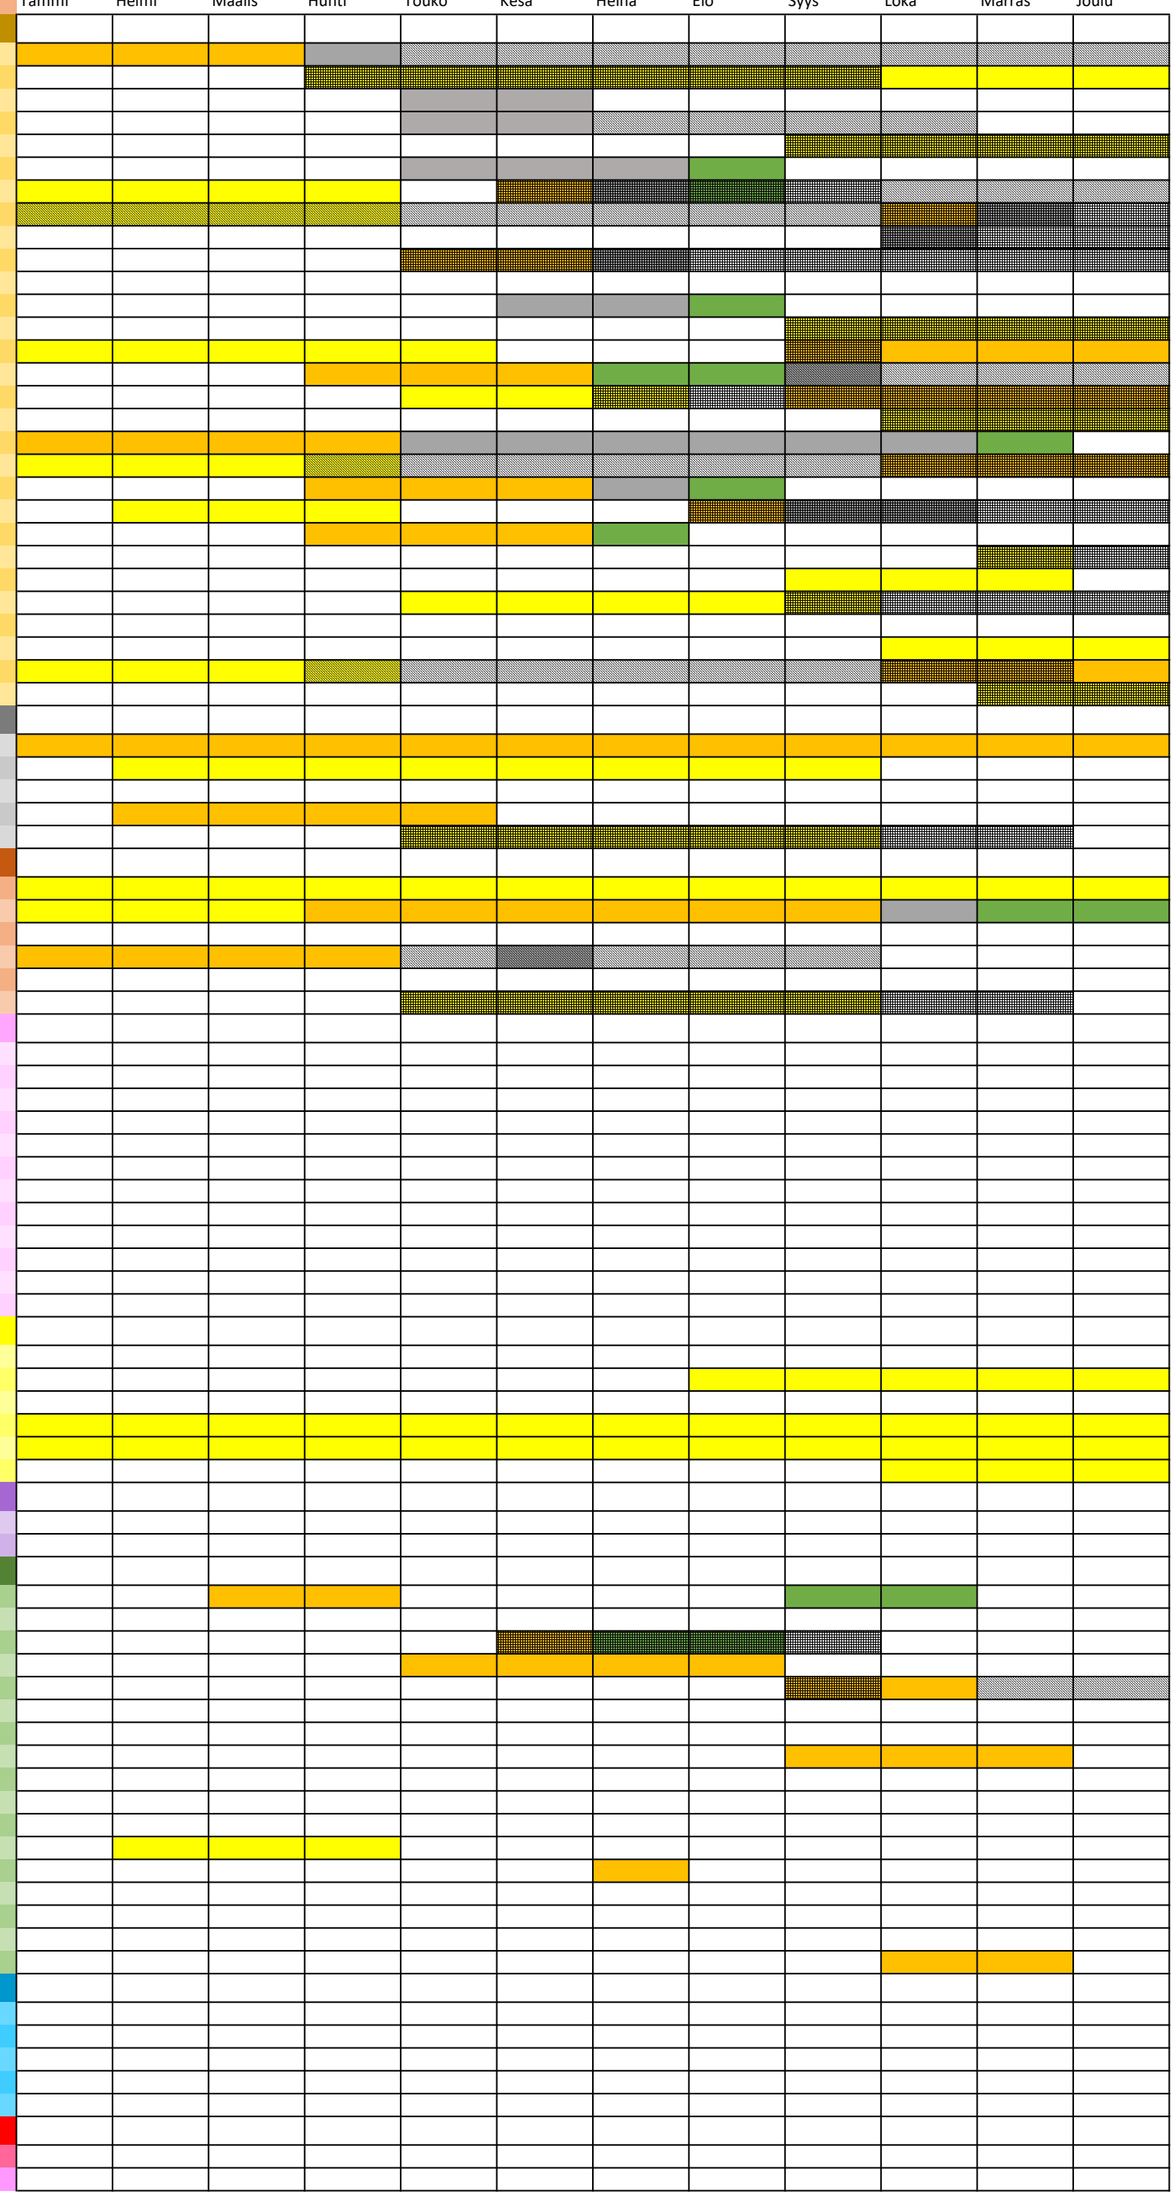
Rakennesuunnittelu	Tekniikka ja Rakennekerrokset	Päällystys	Viimeistely ja vihertyöt
Lisä- ja muutostyöt	Aloitus viivästynyt	Aloitus aikaistunut	Valmistuminen viivästynyt
